❖ أسئلة للمناقشة على خطة المشروع ...

اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية:

1) يقصد ب ..... تحديد أهداف المشروع، وتحديد الطرق المناسبة للوصول إلى تلك الأهداف.

أ. التخطيط ب. المشروع
ج. تخطيط المشروع د. لا شيء مما سبق

2) أن تخطيط المشروع هو وسيلة للوصول إلى الأهداف، وليس غاية في حد ذاته.

أ. العبارة صحيحة
ب. العبارة خاطئة

3) .....هو اجتماع تدعو لعقده الإدارة العليا في المنظمة الأم التي ينتمي إليها المشروع، من أجل وضع الأسس لتنسيق عملية الدخول في المشروع.

أ. الاجتماع التأسيسي ب. الخطة الابتدائية للمشروع
ج. الخطة المركبة للمشروع د. الخطة النهائية للمشروع

4) يعتمد إعداد خطة العمل في المشروع على مفهوم تجزئة هيكل العمل.

أ. العبارة صحيحة
ب. العبارة خاطئة

5) تصبح الخطة نهائية بعد أن يتم تدقيق الخطة المركبة واعتمادها من قبل الإدارة العليا للمنظمة الأم، والتوقيع عليها.

أ. العبارة صحيحة
ب. العبارة خاطئة

6) يتم إعداد الجداول الزمنية للمشروع باستخدام تقنية CPM أو PERT، لتحديد أوقات أنشطة المشروع ابتداءٍ من أول نشاط حتى آخر نشاط متوقع.

أ. العبارة صحيحة
ب. العبارة خاطئة

❖ أسئلة للمناقشة على جدولة المشروع ...

اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية:

1) .... هي عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل المشروع، ابتداءً من لحظة مباشرة العمل في المشروع، مروراً بجميع الأنشطة والأحداث والمحطات الرئيسية وصولاً إلى انتهاء العمل في المشروع، وتحديد الوقت اللازم لتنفيذ المشروع من لحظة البدء وحتى لحظة الانتهاء.

أ. الجدولة ب. المشروع
ج. جدولة المشروع د. تسريع المشروع

2) تتضمن مرحلة ..... تحليل أنشطة المشروع إلى وحدات من نفس نوع العمل وبنفس الحجم.

أ. التخطيط لجدولة المشروع ب. جدولة المشروع
ج. الرقابة على جدولة المشروع د. لا شيء مما سبق

3) ...هي تمثيل بياني لأنشطة المشروع بطريقة تبين التسلسل وتتابع أنشطة المشروع.

أ. خريطة جانت
ب. شبكة المشروع
ج. جدولة المشروع
د. تسريع المشروع

4) يقصد ب ..... العملية التي يتم من خلالها تسريع وقت إنهاء المشروع، مع الاستعداد لتحمل التكاليف الإضافية المترتبة على هذا التسريع.

أ. الجدولة
ب. المشروع
ج. جدولة المشروع
د. تسريع المشروع

في ضوء الخريطة التالية المطلوب اختيار الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية لها:

اسم النشاط	زمن النشاط	الوقت بالأسابيع 16 14 12 10 8 6 4 2
A	8	
B	10	
C	6	
D	8	

1) الخريطة السابقة تعبر عن:

أ. خريطة جانت
ب. شبكة المسار الحرج
ج. شبكة بيرت

2) يبدأ تنفيذ النشاط B بعد بداية النشاط A بمقدار:

أ. أسبوع واحد
ب. أسبوعين
ج. ثلاث أسابيع
د. أربعة اسابيع

3) ينتهي تنفيذ النشاط C :

أ. مع بداية الأسبوع الأول
ب. مع نهاية الأسبوع الرابع
ج. مع نهاية الأسبوع السادس
د. مع نهاية الأسبوع العاشر

4) وقت التنفيذ النشاط D :

أ. أربعة أسابيع
ب. ستة أسابيع
ج. ثمانية أسابيع
د. عشرة اسابيع

5) الوقت اللازم لتنفيذ المشروع هو:

أ. 8 أسابيع
ب. 10 أسابيع
ج. 12 أسبوع
د. 16 اسبوع

إعداد: أسوم ♥

توضح شبكة الأعمال التالية الأنشطة اللازمة لتنفيذ أحد المشروعات، وتتابع كلٍ منها، وأوقات تنفيذ كل منها باليوم:

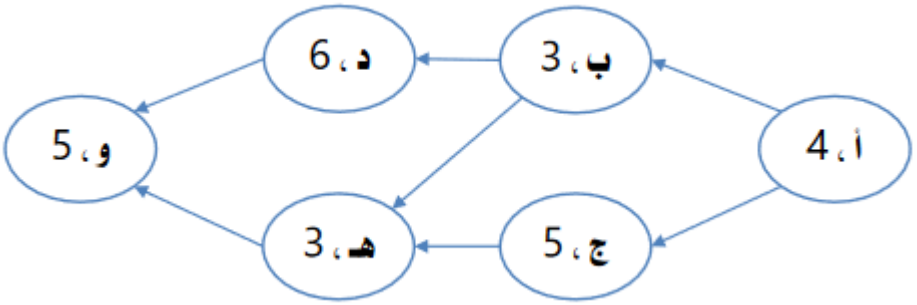

المطلوب: اختيار الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية:

1) الشبكة السابقة تعبر عن:
   أ. خريطة جانت
   ب. شبكة المسار الحرج
   ج. شبكة بيرت

2) الوقت اللازم لتنفيذ النشاط (أ) يساوي:
   أ. 4 أيام
   ب. 3 أيام
   ج. 5 أيام
   د. 6 أيام

3) يمكن البدء في تنفيذ النشاط (ب):
   أ. مع النشاط (أ) في نفس الوقت
   ب. بعد الانتهاء من تنفيذ النشاط (ج)
   ج. بعد الانتهاء من تنفيذ النشاط (أ)
   د. مع النشاط (د) في نفس الوقت

4) الوقت اللازم لتنفيذ المسار (أ – ب – د – و) هو:
   أ. 18 يوم
   ب. 15 يوم
   ج. 17 يوم

5) المسار الحرج هو:
   أ. (أ – ب – د – و)
   ب. (أ – ب – هـ – و)
   ج. (أ – ج – هـ – و)

إعداد: أسوم ♥

توضح شبكة الأعمال التالية الأنشطة اللازمة لتنفيذ أحد المشروعات، وتتابع كلٍ منها، وأوقات تنفيذ كل منها باليوم:

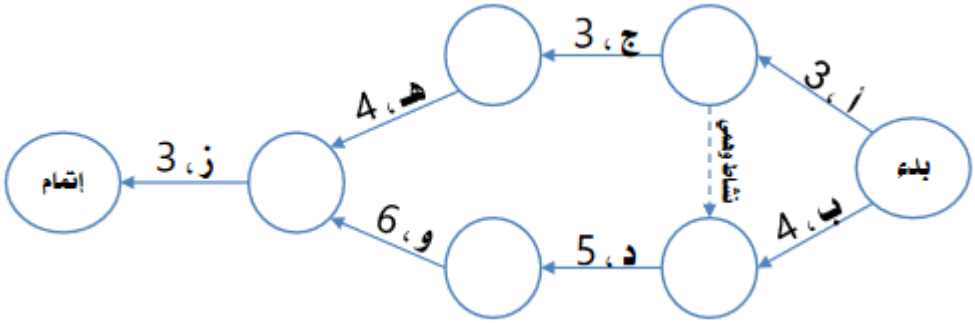

المطلوب: اختيار الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية:

1) الشبكة السابقة تعبر عن:
   أ. خريطة جانت
   ب. شبكة المسار الحرج
   ج. شبكة بيرت

2) الوقت اللازم لتنفيذ النشاط (أ) يساوي:
   أ. 4 أيام
   ب. 3 أيام
   ج. 5 أيام
   د. 6 أيام

3) يمكن البدء في تنفيذ النشاط (ب) :
   أ. مع النشاط (أ) في نفس الوقت
   ب. بعد الانتهاء من تنفيذ النشاط (ج)
   ج. مع النشاط (د) في نفس الوقت
   د. بعد الانتهاء من تنفيذ النشاط (أ)

4) الوقت اللازم لتنفيذ المسار (أ – ج – هـ - ز) هو:
   أ. 13 يوم
   ب. 15 يوم
   ج. 17 يوم

5) المسار الحرج هو:
   أ. (أ – ج – هـ – ز)
   ب. (أ – د – و – ز)
   ج. (ب – د – و – ز)

❖ أسئلة للمناقشة على موازنة المشروع ...

اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية:

1) يقصد ب ..... عملية تقدير تكلفة المشروع عن طريق تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ أنشطة المشروع، وتقدير التكلفة المتوقعة لهذه الموارد وقت استخدامها، وصولاً إلى التكلفة التقديرية للمشروع ككل من لحظة مباشرة العمل حتى لحظة الانتهاء.
   أ. التقدير
   ب. الرقابة
   ج. موازنة المشروع
   د. لا شيء مما سبق

إعداد: أسوم ♥

2) تعتبر موازنة المشروع بمثابة تسعير لخطة المشروع.
   أ. العبارة صحيحة
   ب. العبارة خاطئة

3) وفقاً لطريقة ..... يتم حساب مخصصات تقديرية للمشروع، اعتماداً على التجارب السابقة وبعض البيانات التاريخية والخبرة والحدس.
   أ. المخصصات التقديرية
   ب. إعداد الموازنة من الأعلى إلى الأسفل
   ج. إعداد الموازنة من الأسفل الأعلى

4) يعاب على طريقة المخصصات التقديرية أنها أكثر تكلفة من غيرها، وأنها تحتمل نسبة من الخطأ والبعد عن الدقة المطلوبة.
   أ. العبارة صحيحة.
   ب. العبارة خاطئة

❖ أسئلة للمناقشة على الرقابة على المشروع ...

اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية:

1) يقصد ب ..... أحد وظائف إدارة المشروع التي يتم من خلالها جمع البيانات والمعلومات بهدف قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالأداء المرغوب أو المخطط له، تمهيداً لعمل التغذية العكسية من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير وتحسين الأداء.
   أ. الرقابة على المشروع
   ب. المشروع
   ج. إدارة المشروع
   د. لا شيء مما سبق

2) تنتهي الرقابة على المشروع بالتغذية العكسية واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
   أ. العبارة صحيحة
   ب. العبارة خاطئة

3) يتم هذا النوع من الرقابة عن طريق فحص واختبار الأنشطة والعمليات أثناء حدوثها، للتأكد من سيرها حسب ما هو مخطط لها.
   أ. الرقابة باستخدام الربط الضبط
   ب. الرقابة اثناء العملية
   ج. الرقابة اللاحقة

4) تقيس النسبة الحرجة سلامة التقدم الفعلي في المشروع من خلال عاملين، هما :مؤشر أداء الوقت ومؤشر أداء التكلفة.
   أ. العبارة صحيحة
   ب. العبارة خاطئة

❖ أسئلة للمناقشة على إنهاء المشروع ...

اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية:

1) يقصد ب ..... توقف العمل الأساسي أو الجوهري في المشروع، أو إبطاؤه للدرجة التي لا يحصل معها تقدم في عمل المشروع لاحقاً، أو تأخير عمل المشروع نتيجة تحويل موارد المشروع أو توظيفها في مشاريع أخرى تابعة للمنظمة الأم لكونه لم يعد مهماً للمنظمة"

ه. إنهاء المشروع
و. إبطاء المشروع
ز. تأخر المشروع
ح. لا شيء مما سبق

2) قد يتم إنهاء المشروع بسبب وجود مشاكل تكنولوجية.

ج. العبارة صحيحة
د. العبارة خاطئة

3) وفقاً لطريقة ..... يتم إنهاء المشروع عن طريق الإهلاك البطيء بتقليل الموازنة، وتخفيض المبالغ المرصودة للمشروع عن ما هو مقرر لها. حتى يحصل إهلاك بطيء وتدريجي للمشروع.

أ. الإنهاء بالإطفاء
ب. الإنهاء بالإضافة
ج. الإنهاء بالتكامل
د. الإنهاء بالتجويع

4) عندما ينجح المشروع ويحقق أهدافه، يمكن للمنظمة إنهاؤه من خلال إلحاقه بالمنظمة الأم كمؤسسة فرعية منها.

أ. العبارة صحيحة
ب. العبارة خاطئة
